



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN
BALAI PENGELOLAAN DAS CITARUM-CILIWUNG

RANCANGAN TEKNIS

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN MANGROVE
TAHUN 2024 (T-0)

LUAS	: 30 HA
DESA	: PAGEDANGAN ILIR
KECAMATAN	: KRONJO
KABUPATEN	: TANGERANG
PROVINSI	: BANTEN
FUNGSI KAWASAN	: HUTAN LINDUNG
SUB DAS	: PASILIAN HILIR - CIMANCEURI HILIR
DAS	: CIPASILIAN - CIMANCEURI
PELAKSANA	: LMDH PAGEDANGAN ILIR

BOGOR, FEBRUARI 2024

LEMBAR PENGESAHAN
RANCANGAN TEKNIS REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN MANGROVE
TAHUN 2024 (T-0)

LUAS	: 30 HA
DESA	: PAGEDANGAN ILIR
KECAMATAN	: KRONJO
KABUPATEN	: TANGERANG
PROVINSI	: BANTEN
FUNGSI KAWASAN	: HUTAN LINDUNG
SUB DAS	: PASILIAN HILIR - CIMANCEURI HILIR
DAS	: CIPASILIAN - CIMANCEURI
PELAKSANA	: LMDH PAGEDANGAN ILIR

Disahkan Oleh
Kepala Balai Pengelolaan
DAS Citarum Ciliwung,

Dinilai Oleh
Kepala Seksi Perencanaan
dan Evaluasi DAS,

Bogor, Februari 2024
Disusun Oleh

Pina Ekalipta S. Hut., M. P.
NIP. 19720822 199803 1 001

Bagus Budiprakoso, S. P., M. Si.
NIP. 19870402 201012 1 005

Rini Asniar Karno, S. Hut., M. M.
NIP. 19720903 199903 2 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala kehendak-Nya, Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mangrove Penanaman Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2024 (T-0) ini dapat diselesaikan. Lokasi penanaman kegiatan RHL Mangrove ini berada di Desa Pagedangan Ilir, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Rancangan Teknis Kegiatan RHL Mangrove Penanaman Tahun Berjalan berdasarkan pada Peraturan Menteri LHK nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan RHL; Peraturan Menteri LHK Nomor : P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang Perubahan Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan RHL; Peraturan Menteri LHK Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Nomor: SK.17/PDASRH/SET/KEU.0/10/2023 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Tahun 2024; Surat Pengesahan Dokumen Anggaran Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BA 029 Program Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-029.04.2.427216/2024 tanggal 28 November 2023.

Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dan Tim BPDAS Citarum-Ciliwung yang telah bekerjasama dalam menyusun Rancangan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mangrove Penanaman Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2024 (T-0). Semoga rancangan ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, Februari 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
II. RISALAH UMUM	3
A. KONDISI BIOFISIK	3
B. KONDISI SOSIAL EKONOMI	4
A. POLA TANAM DAN KEBUTUHAN BIBIT	6
B. RANCANGAN PENANAMAN	7
IV. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA.....	11
V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nama-nama Anggota Pagedangan Ilir.....	4
Tabel 2. Pola Tanam dan Kebutuhan Bibit	6
Tabel 3. Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman RHL Mangrove.....	8
Tabel 4. Kebutuhan Bahan dan Peralatan Kegiatan Penanaman RHL	9
Tabel 5. Rancangan Anggaran Biaya RHL P0 Tahun 2024 KTH Rimba Embun Pagi.....	11
Tabel 6. Rancangan Anggaran Biaya RHL P1 Tahun 2024 KTH Rimba Embun Pagi	12
Tabel 7. Rancangan Anggaran Biaya RHL P2 Tahun 2024 KTH Rimba Embun Pagi	13
Tabel 8. Tata Waktu Pelaksanaan.....	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pola Tanam Skema Silvofishery, Intensif dan Pengkayaan	6
Gambar 2. Papan Nama Kegiatan	15
Gambar 3. Tipikal Ajir	16
Gambar 4. Contoh Gubuk Kerja	17
Gambar 5. Foto Lokasi Sebelum Penanaman	18

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan diantaranya dapat dilakukan secara vegetatif yaitu melalui kegiatan reboisasi untuk lahan di dalam kawasan hutan dan penghijauan untuk lahan di luar kawasan hutan.

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum Ciliwung merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), BPDAS Citarum Ciliwung memiliki upaya untuk mendukung kegiatan RHL Mangrove. Oleh karena manfaatnya yang begitu besar, sangat penting agar seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui dan memahami esensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan RHL Mangrove, sehingga dampak positifnya secara langsung akan berpengaruh terhadap harkat hidup masyarakat. BPDAS Citarum Ciliwung akan berperan secara penuh untuk memberi pemahaman dan melaksanakan RHL pada Hutan Mangrove ini bersama dengan masyarakat. Penyusunan rancangan teknis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan dalam rangka Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mangrove Penanaman Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan Penyusunan Rancangan ini adalah tersusunnya buku Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mangrove Penanaman Tahun Berjalan di lingkup wilayah pengelolaan BPDAS Citarum-Ciliwung Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kronjo, Desa Pagedangan Ilir.

Sedangkan tujuan kegiatan penyusunan Rancangan Kegiatan ini adalah agar Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mangrove Penanaman Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2024 dapat terlaksana dengan baik.

II. RISALAH UMUM

A. KONDISI BIOFISIK

1. Letak dan Luas

a. Letak Administratif

- Desa : Pagedangan Ilir
- Kecamatan : Kronjo
- Kabupaten : Tangerang
- Provinsi : Banten

b. Letak Geografis

- Secara hidrologis, lokasi terletak pada DAS Cipasilian - Cimanceuri.
- Secara Geografis terletak pada kordinat -6.037394 LS dan 106.444594 BT.

c. Luas Lokasi Tanam

- Rencana luas lokasi tanam adalah 30 Ha dalam bentuk tambak.

2. Aksesibilitas

- Jarak ke Pusat Desa : 2,2 Km
- Jarak ke Kota Kecamatan : 9 Km
- Jarak ke Kota Kabupaten : 24 Km
- Jarak ke Kota Provinsi : 94 Km

B. KONDISI SOSIAL EKONOMI

1. Tenaga Kerja

Pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan Pagedangan Ilir yang dibimbing oleh pendamping lapangan

2. Kelembagaan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan Pagedangan Ilir dengan anggota dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Nama-nama anggota LMDH Pagedangan Ilir

No.	Nama	Jenis Kelamin	NIK
1	2	3	4
1	H. Bahrul Ulum, S. E.	Laki-Laki	3603070404720001
2	H. Makdis Adhari	Laki-Laki	3603070203770001
3	Ahmad Yusuf. S	Laki-Laki	3603070803870004
4	Hj. Ella Sutiawati	Perempuan	3603074303690001
5	H. Jupri Bin H. Bonjan	Laki-Laki	3603071407600003
6	H.M. Aliudin	Laki-Laki	36030722009540003
7	H. Mahyudin	Laki-Laki	3603071811890001
8	Hj. Saadiyah	Perempuan	360307520260003
9	Sheyila Febiola	Perempuan	36030766059400001
10	Ika Yulistiani	Perempuan	3603074507810004
11	H. Kusni	Laki-Laki	3603331603460001
12	Billy Ainun Ilham	Laki-Laki	3603072202970002
13	Suhangga	Laki-Laki	3603070206950011
14	Taopik Rahman	Laki-Laki	

No.	Nama	Jenis Kelamin	NIK
1	2	3	4
15	Aji Suratman	Laki-Laki	3603071202680001
dst....			

III. RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANAMAN

A. POLA TANAM DAN KEBUTUHAN BIBIT

Kegiatan Penanaman menggunakan pola tanam skema silvofishery, gambar rencana pola tanam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mangrove disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pola Tanam Skema Silvofishery

Kebutuhan bibit sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

Tabel 2. Pola Tanam dan Kebutuhan Bibit

No.	Pekerjaan	Jumlah Bibit Per ha (Bibit)	Jenis Bibit	Volume Bibit (Batang) dalam 30 ha
1	2	3	4	5
1	Penanaman (P0)	1.760	<i>Rhizophora</i> sp.	52.800
3	Pemeliharaan Tahun Pertama	320	<i>Rhizophora</i> sp.	9.600
2	Pemeliharaan Tahun Kedua (P2)	160	<i>Rhizophora</i> sp.	4.800
Total				67.200

B. RANCANGAN PENANAMAN

1. Persiapan

Penyiapan lahan berkaitan dengan penyediaan habitat tumbuh yang sesuai bagi jenis tanaman mangrove yang akan ditanam. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap persiapan adalah:

- a. Pembuatan dan Pemasangan ajir sesuai titik-titik penanaman
- b. Penyiapan titik bagi bibit (di masing-masing areal penanaman)
- c. Perbaikan saluran pasang surut.

2. Kebutuhan Tenaga Kerja dan Bahan

Mengacu pada pola tanam di atas dibutuhkan tenaga kerja sebagaimana berikut ini:

- a. Pemancangan ajir
- b. Pembuatan papan nama dan gubuk kerja
- c. Pembersihan lapangan, pengangkutan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan penyulaman
- d. Pengawasan mandor
- e. Perbaikan saluran pasang surut
- f. Pemancangan ajir

3. Bahan dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain:

- a. Ajir
- b. Patok
- c. Papan Nama Kegiatan
- d. Gubuk Kerja
- e. Pelindung Tanaman
- f. Peralatan Kerja (alat angkut bibit, cangkul, sabit, parang, dan sebagainya)

Tabel 3. Rencana Kebutuhan Tenaga (HOK) Penanaman RHL Mangrove

No	Komponen	Satuan	Kebutuhan		
			Penanaman (P-0)	Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (P-1)	Pemeliharaan Tanaman Tahun Kedua (P-2)
1	2	3	4	5	6
Silvofishery					
A.	Persiapan Lahan				
1.	Pemasangan ajir	HOK	90	-	-
2.	Pembuatan papan nama dan gubuk kerja	HOK	11	-	-
B.	Penanaman dan Pemeliharaan				
1.	Pembersihan lapangan, pengangkutan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman dan penyulaman	HOK	840	-	-
2.	Perbaikan saluran pasang surut	HOK	195	-	-
3.	Pemeliharaan tanaman, pengangkutan bibit, penyulaman dan perbaikan saluran pasut	HOK	-	330	195
C.	Pengawasan Mandor	OB	10	12	12

Tabel 4. Kebutuhan Bahan dan Peralatan Kegiatan Penanaman RHL

No	Komponen	Satuan	Kebutuhan		
			Penanaman Tahun Berjalan (P-0)	Pemeliharaan Tahun Pertama (P-1)	Pemeliharaan Tahun Kedua (P-2)
1	2	3	4	5	6
Silvofishery					
1	Pengadaan Ajir	Ajir	48.000	-	-
2	Pengadaan Bahan Papan Nama	Unit	1	-	-
3	Pengadaan Bahan Gubuk/Pondok Kerja	Unit	1	-	-
4	Saluran Pasang Surut	Paket	13	13	-

a. Teknik Pelaksanaan

Pembentukan satuan unit kerja distribusi bibit dan penanaman

- 1) Ketua regu kerja bertugas menentukan letak lokasi distribusi benih/bibit serta lokasi penanaman merangkap sebagai pencatat kegiatan.
- 2) Anggota regu bertugas melakukan distribusi benih/bibit serta penanaman sesuai jumlah rencana bibit yang akan ditanam.
- 3) Persiapan peralatan kerja antara lain : alat angkut benih/bibit, cangkul/sekop, parang/golok, perlengkapan logistik lainnya.
- 4) Menentukan titik/lokasi penempatan benih/bibit.
- 5) Merencanakan jumlah tenaga kerja dan anggaran biaya yang diperlukan.
- 6) Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan distribusi dan penanaman

b. Pelaksanaan

- 1) Melakukan pembersihan jalur tanaman dan pemasangan ajir.
- 2) Benih/bibit yang telah disiapkan diangkut ke areal penanaman. Benih/bibit dapat diangkut dengan menggunakan motor, keranjang, rakit, atau dipikul sampai ke lokasi penanaman dan diletakkan dekat lubang tanaman yang telah dibuat.
- 3) Melakukan penanaman.

c. Pencatatan dan Pelaporan

Dilakukan pencatatan pada laporan/register penanaman sebagai berikut :

- 1) Nama lokasi.
- 2) Rencana dan realisasi distribusi benih/bibit dan penanaman pada lokasi.
- 3) Jumlah hari orang kerja (HOK) yang telah digunakan, prestasi kerja dan mutu pekerjaan.

C. RANCANGAN PEMELIHARAAN TANAMAN

Kegiatan Pemeliharaan Tanaman mangrove dilakukan sesuai pemeliharaan pada kegiatan reboisasi dengan catatan pembersihan lapangan dilakukan pada areal perlu dibersihkan. Disamping itu, untuk pengendalian hama dan penyakit pada tanaman mangrove dari serangan kepiting/ketam, ulat daun dan batang, cendawan akar, tritip serta gulma (biasanya lumut) dapat dilakukan dengan cara :

1. Benih/bibit mangrove ditanam lebih banyak atau lebih rapat
2. Membungkus benih/bibit dengan bambu atau botol plastik.
3. Menggunakan insektisida secara hati-hati dan terbatas.
4. Bibit sulaman :
 - a. P0 sebanyak 10%.
 - b. P1 sebanyak 20%.
 - c. P2 sebanyak 10%.
5. Standar hasil kegiatan Keberhasilan tanaman pada P0, P1, dan P2 paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tanaman P0.

IV. RANCANGAN ANGGARAN BIAYA

Rancangan Anggaran Biaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mangrove P0 2024 LMDH Pagedangan Ilir seluas 30 Ha dengan skema Silvofishery adalah sebesar **Rp. 283.560.000,-** dengan biaya Pemeliharaan Tanaman RHL Mangrove pada Tahun Pertama (P1) adalah sebesar **Rp 56.770.000,-** dan Pemeliharaan Tanaman RHL Mangrove pada Tahun Kedua (P2) adalah sebesar **Rp 30.495.000,-** sebagaimana pada Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7.

Tabel 5. Rancangan Anggaran Biaya RHL P0 Tahun 2024 LMDH Pagedangan Ilir

No.	JENIS BELANJA/ KOMPONEN	SATUAN	Volume/ha	VOLUME 30 ha	SATUAN BIAYA	BIAYA TOTAL
1	2	3		4	5	6
I.	Gaji/Upah					
1	Pemancangan ajir	HOK	3	90	85.000	7.650.000
2	Pembuatan papan nama dan gubuk kerja	HOK	1,08	11	85.000	935.000
3	Pembersihan lapangan, Pengangkutan bibit, penanaman, pemeliharaan dan penyulaman	HOK	28	840	85.000	71.400.000
4	Pengawasan mandor	OB	0,1	10	360.000	4.680.000
5	Perbaikan saluran pasut	HOK	15	195	85.000	16.575.000
	Jumlah I					101.160.000
II.	Bahan					
1	Pengadaan ajir	Unit	1600	48.000	500	24.000.000
2	Pengadaan papan nama	Buah	0,1	1	500.000	500.000
3	Pengadaan bahan gubuk kerja	Paket	0,1	1	1.200.000	1.200.000

No.	JENIS BELANJA/ KOMPONEN	SATUAN	Volume/ha	VOLUME 30 ha	SATUAN BIAYA	BIAYA TOTAL
4	Saluran pasang surut	Paket	1	13	1.700.000	22.100.000
	Jumlah II					47.800.000
III.	Lain-lain					
	Insentif silvo	Paket	1	30	1.000.000	30.000.000
	Jumlah III					30.000.000
IV.	Bibit					
1	Bibit Rhizophora	Batang	1.760	52.800,00	2.000	105.600.000
	Jumlah IV					105.600.000
	Total					283.560.000

Tabel 6. Rancangan Anggaran Biaya RHL P1 LMDH Pagedangan Ilir

No.	JENIS BELANJA/ KOMPONEN	SATUAN	Volume/ha	VOLUME 30	SATUAN BIAYA	BIAYA TOTAL
1	2	3		4	5	6
I.	Gaji/Upah					
1	Pemeliharaan tanaman, pengangkutan bibit, penyulaman dan perbaikan saluran pasut	HOK	11	330	85.000	28.050.000
2	Pengawasan	OB	0,1	12	360.000	4.320.000
	Jumlah I					32.370.000
III.	Bahan					
1	Saluran pasang surut	Paket	1	13,00	400.000	5.200.000
	Jumlah III					5.200.000
IV	Bibit					
1	Bibit <i>Rhizopora sp (Penyulaman 20%)</i>	Batang	320	9.600	2.000	19.200.000

No.	JENIS BELANJA/ KOMPONEN	SATUAN	Volume/ha	VOLUME 30	SATUAN BIAYA	BIAYA TOTAL
	Jumlah IV					19.200.000
	Total					56.770.000

Tabel 7. Rancangan Anggaran Biaya RHL P2 LMDH Pagedangan Ilir


No.	JENIS BELANJA/ KOMPONEN	SATUAN	Volume/ha	VOLUME 30	SATUAN BIAYA	BIAYA TOTAL
1	2	3		4	5	6
I.	Gaji/Upah					
1	Pemeliharaan tanaman, pengangkutan bibit, penyulaman dan perlindungan tanaman	HOK	6,50	195	85.000	16.575.000
2	Pengawasan	OB	0,1	12	360.000	4.320.000
	Jumlah I			344		20.895.000
II.	Bibit					
1	Bibit <i>Rhizopora sp</i> 10% (160 batang)	Batang	160	4.800	2.000	9.600.000
	Jumlah II					9.600.000
	Total					30.495.000

V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Tata waktu pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mangrove Penanaman Tahun Berjalan di lingkup wilayah pengelolaan BPDAS Citarum-Ciliwung Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kronjo, Desa Pagedangan Ilir dapat dilihat pada Tabel 8.


Tabel 8. Tata Waktu Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	TAHUN 2024									
		MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
I.	Kegiatan										
1.	Persiapan lapangan										
2.	Pemasangan ajir										
3.	Pembuatan papan nama dan gubuk / pondok kerja										
4.	Distribusi benih/bibit ke lubang tanam dan penanaman										
5.	Intensif Silvofishery										
6.	Pembuatan Saluran Pasang Surut										
8.	Pemeliharaan										
9.	Pengawasan/Mandor										

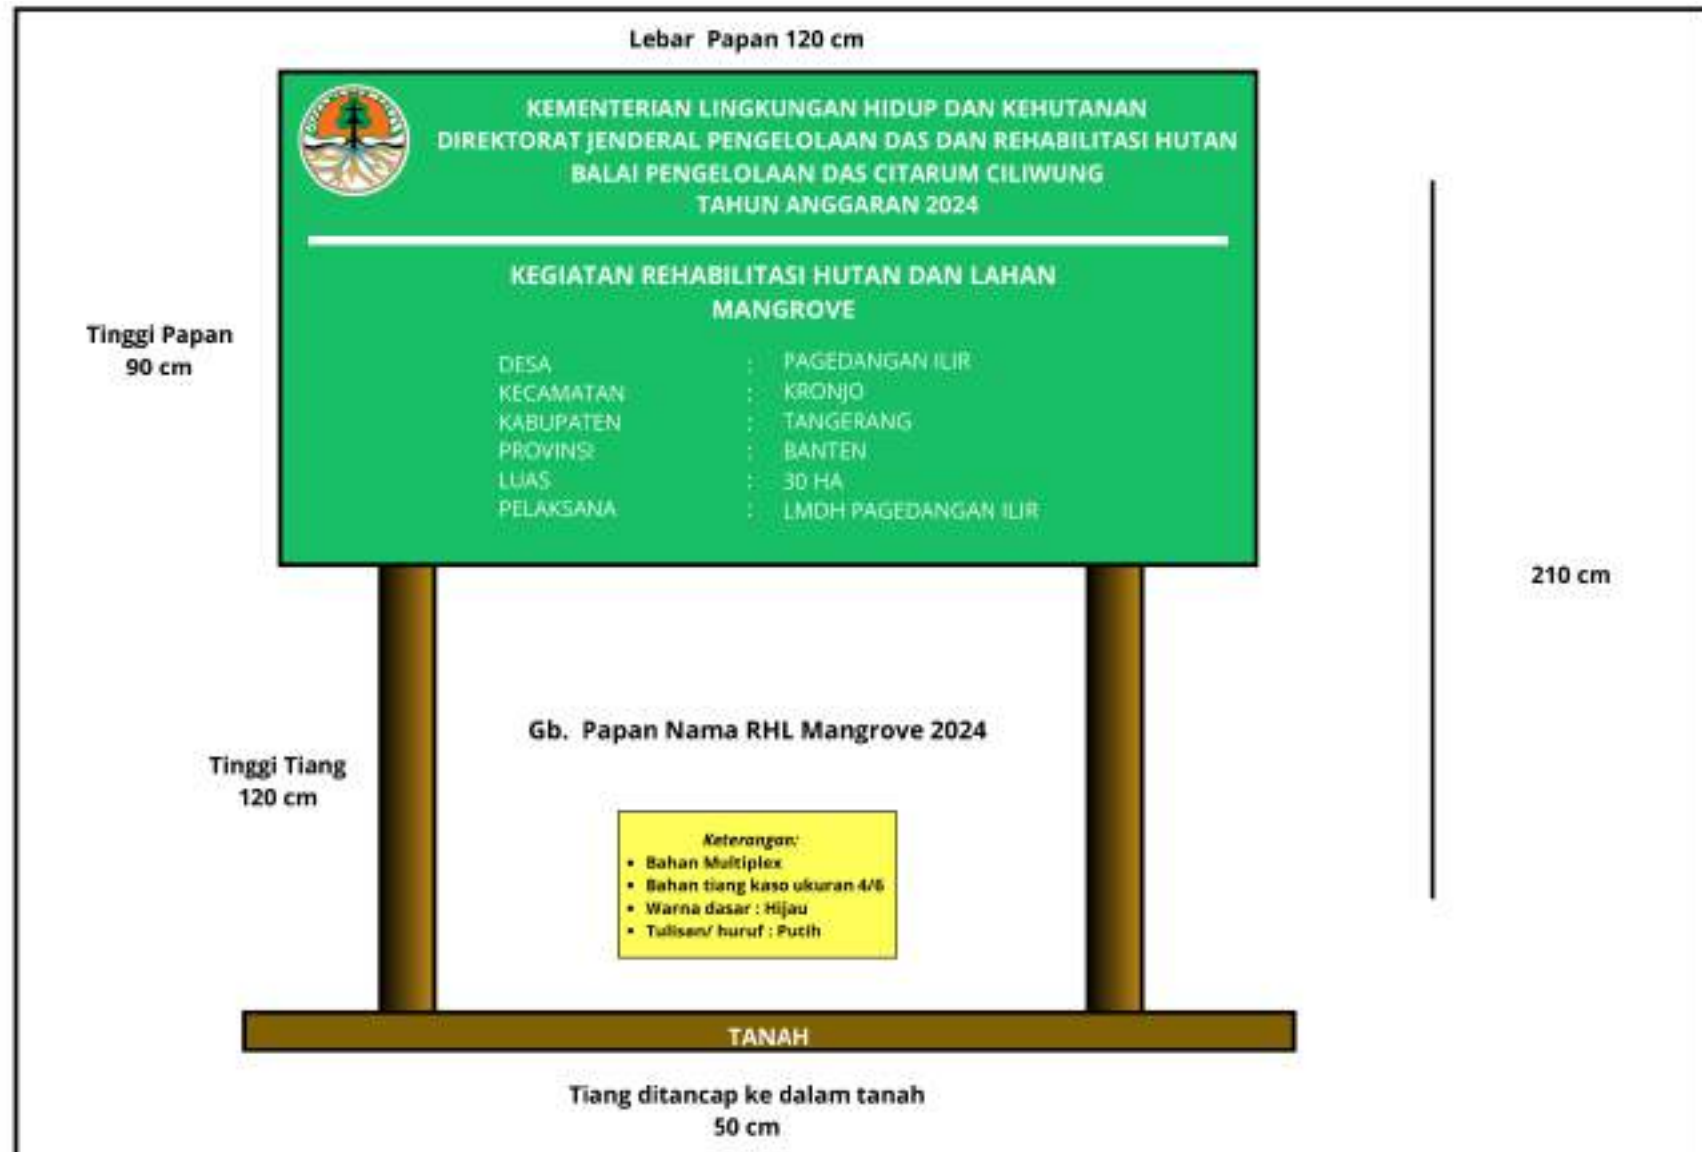

Gambar 2. Papan Nama Kegiatan


Ajir Tanaman

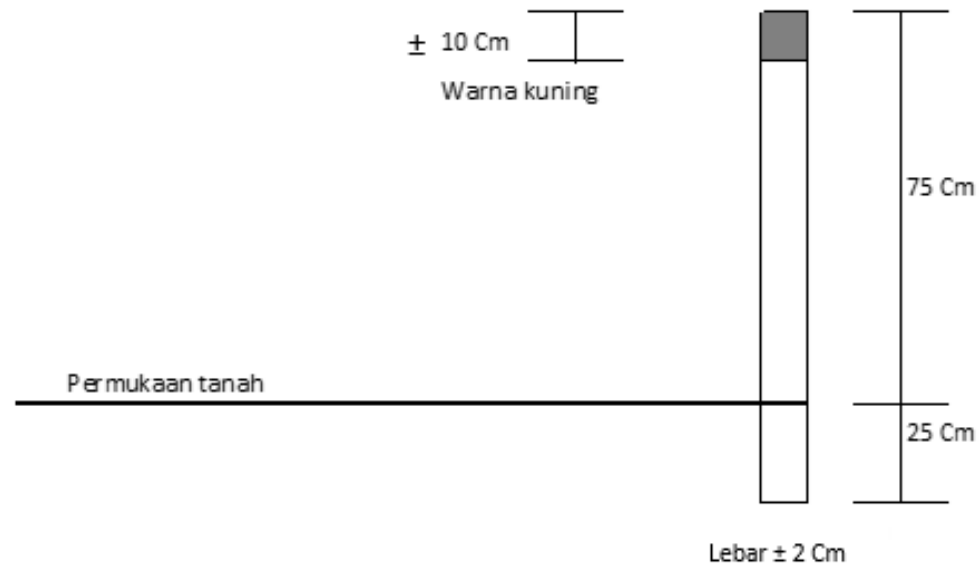

Gambar 3. Tipikal Ajir

Catatan:

1. Ukuran dan bahan patok arah larian di sesuaikan dengan kondisi lapangan
2. Ukuran dan bahan ajir di sesuaikan dengan kondisi lapangan

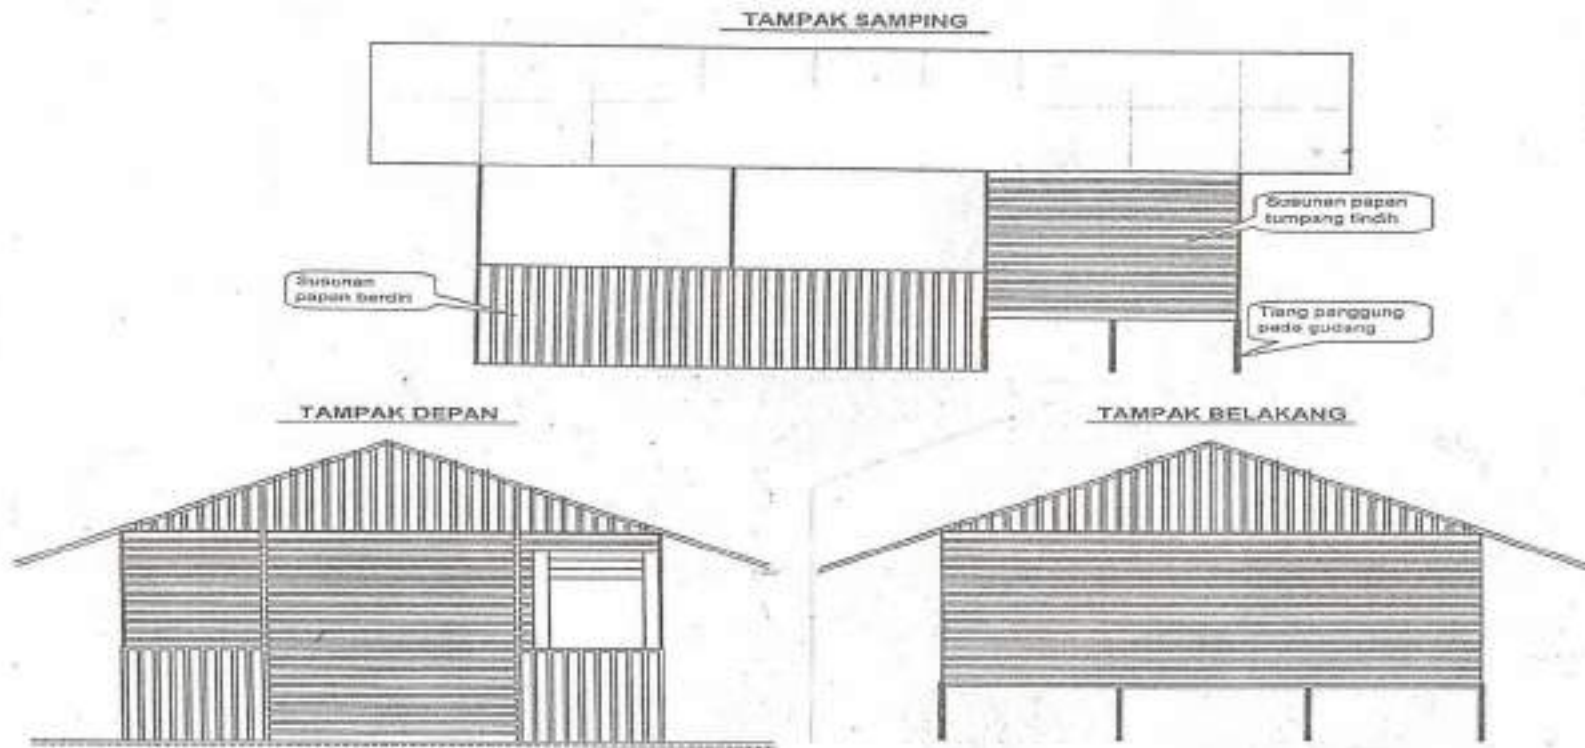

Gambar 4. Contoh Gubuk Kerja


Catatan :

- Ukuran dan jenis bahan yang digunakan menyesuaikan kondisi lapangan

Desa : Pagedangan Ilir
Kecamatan : Kronjo
Kabupaten : Tangerang
Koordinat : -6.037394 LS dan 106.444594 BT



Gambar 5. Foto Lokasi Sebelum Penanaman

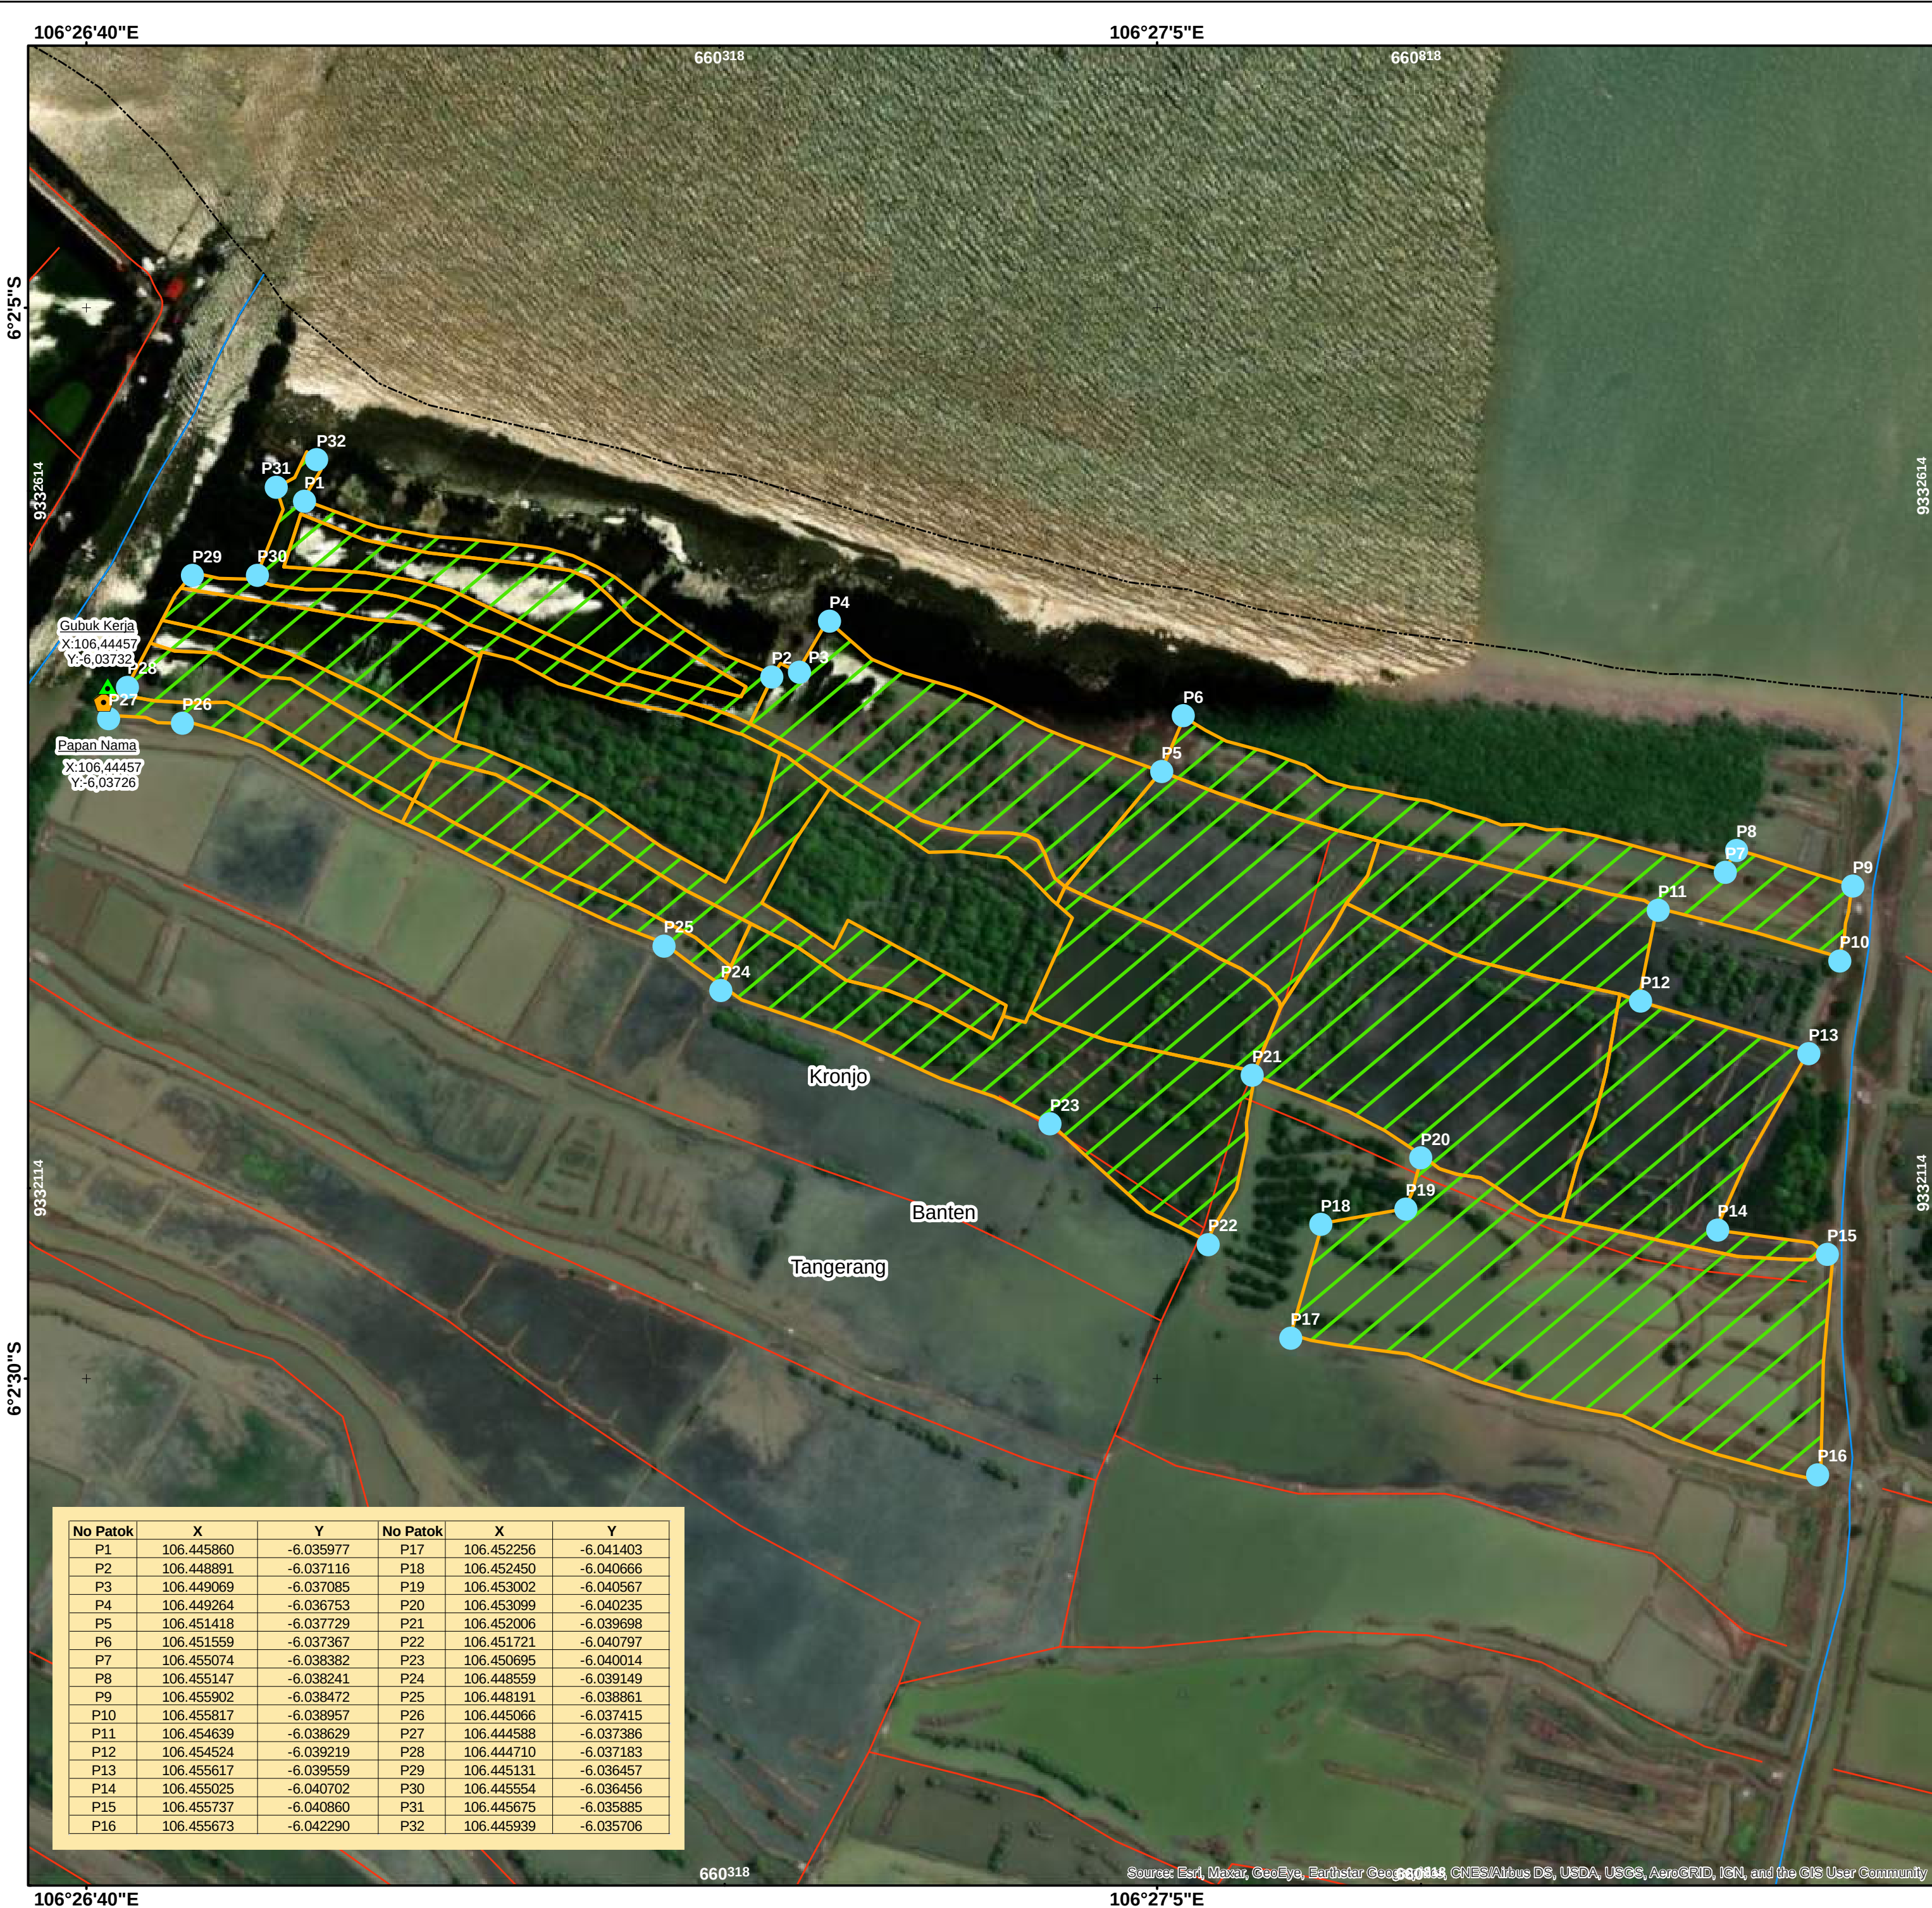

PETA RANCANGAN TEKNIS KEGIATAN RHL MANGROVE TAHUN 2024

SKALA 1 : 3,448

0 50 100 200 300 m

Sistem Koordinat : Geografis

DAS	: CIMANCEURI, CIPASILIAN
SUBDAS	: CIMANCEURI HILIR, PASILIAN HILIR
FUNGSI KAWASAN	: HUTAN LINDUNG
LMDH	: PAGEDANGAN ILIR
DESA	: PAGEDANGAN ILIR
KECAMATAN	: KRONJO
KABUPATEN	: TANGERANG
PROVINSI	: BANTEN
LUAS	: 30 HA

LEGENDA

●

Patok Batas

⬢

Papan Nama

▲

Gubuk Kerja

Lokasi Penanaman RHL Mangrove Skema Sylvofishery

Batas Kabupaten

Batas Kecamatan

Batas Desa

Sungai

Jalan

Sumber Peta:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000
2. Peta Kawasan Hutan Lampiran SK Menteri Kehutanan No.419/Ktps-II/1999, tanggal 15 Juni 1999
3. SK.8097/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Banten Sampai Dengan Tahun 2017
4. Hasil Groundcheck, Pengukuran dan Pemancangan Batas Lokasi Februari Tahun 2024

Disusun oleh:
An. Tim Penyusun Peta

Dinilai:
Kepala Seksi Program
BPDAS Citarum Ciliwung

Kartika Triasary, S.Hut., M.Si
NIP. 19820421 200912 2 003

Bagus Budiprakoso, SP., M.Si
NIP. 19870402 201012 1 005

Disahkan:
Kepala BPDAS
Citarum Ciliwung

Pina Ekalipta, S.Hut, MP
NIP. 19720822 199803 1 001

105°40'0"E 106°0'0"E 106°20'0"E 106°40'0"E

5°45'0"S 6°0'0"S

WILAYAH KERJA
BPDAS CITARUM CILIWUNG
Skala 1: 1.000.000

■ Kawasan HP
■ Kawasan HK
■ Kawasan HL
□ Lokasi Penanaman

105°40'0"E 106°0'0"E 106°20'0"E 106°40'0"E

5°45'0"S 6°0'0"S

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN
BALAI PENGELOLAAN DAS CITARUM CILIWUNG
Bogor, Februari 2024
